



# Assainissement durable dans les quartiers non lotis et périphériques de Ouagadougou (PériSan Ouagadougou)

## Objectifs, Méthodologie, Acquis

WaterAid  
11 BP 1211 CMS Ouagadougou 11  
Tél 25 37 41 70  
[www.wateraid.org](http://www.wateraid.org)





**Coût global € 3 164 848. 94 soit 2 076 004 818 FCFA**

**Durée : du 1<sup>er</sup> avril 2013 au 30 septembre 2017**

<b>Partenaires</b>	<b>Contribution (EURO)</b>	<b>Pourcentage</b>
<b>WaterAid</b>	<b>309 302.59</b>	<b>9.77%</b>
<b>ONEA</b>	<b>319 546.35</b>	<b>10.10%</b>
<b>Eau Vive</b>	<b>120 000.00</b>	<b>3.79%</b>
<b>Commune de Ouagadougou</b>	<b>72 000.00</b>	<b>2.27%</b>
<b>Union Européenne</b>	<b>2 344 000</b>	<b>74.06%</b>



# Plan de l'exposé

1. Objectifs du projet
2. Résultats attendus
3. Composantes/activités
4. Méthodologie de délivrance des services
5. Résultats
6. Difficultés et leçons apprises



# 1. Objectifs

## 1. Objectif global

Contribuer à l'atteinte des OMD relatifs à l'assainissement par l'équipement des ménages, des écoles et des centres de santé en ouvrages et la promotion de l'hygiène / réduction du taux de prévalence des maladies

## 2. Objectif spécifique

Améliorer l'accès aux services durables d'assainissement de **270 000** personnes défavorisées de **5 quartiers non lotis** et **16 secteurs périphériques**, soit **67%** de la population totale des **quartiers non lotis et périphériques** de la commune de Ouaga.



# 2. Résultats Attendus

- La commune de Ouagadougou développe et pilote une offre de services publics d'assainissement au profit des populations des quartiers non lotis et périphériques
- **120 opérateurs privés** ont les capacités de répondre à la demande urbaine et périurbaine de services sur toute la chaîne d'assainissement.
- **270.000 personnes** ont accès à des services améliorés d'assainissement et adoptent des pratiques saines d'hygiène.
- **Les enseignants et élèves** sont formés aux techniques de promotion de l'hygiène.




## 2. Résultats Attendus

- **15 400 ouvrages d'assainissement** sont réalisées
- **100 latrines communautaires** sont réalisées ou réhabilitées
- **100% des écoles et des centres de santé** sont équipées en latrines, lave-mains et poubelles.
- Au moins **5 initiatives de valorisation** sont soutenues permettant l'émergence de micro-entreprises sociales.




# 3. Composantes du projet

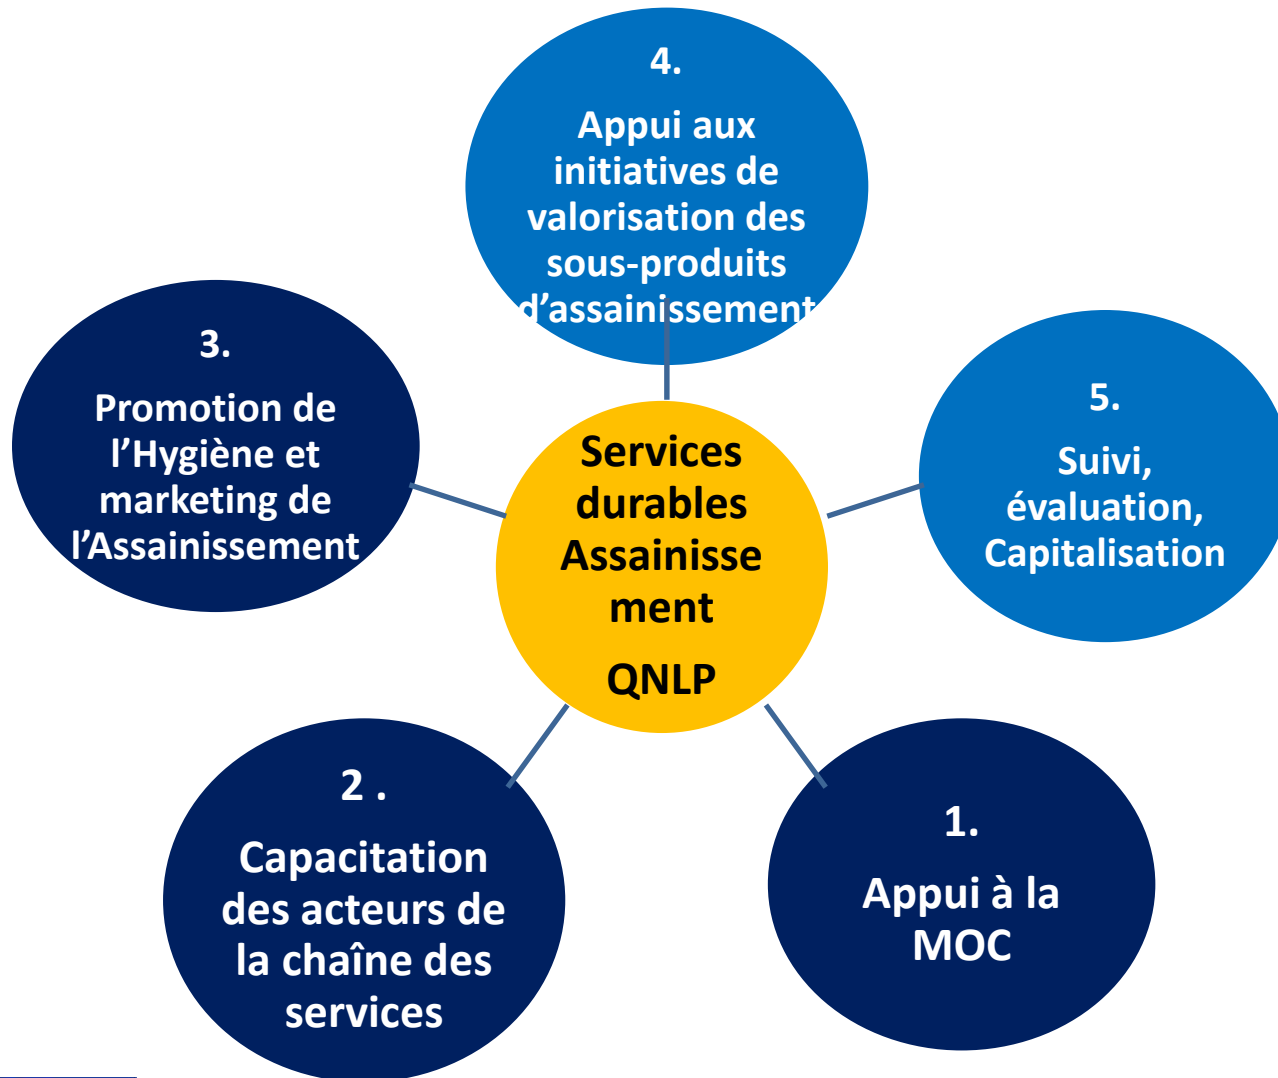



# 4. Méthodologie de mise en œuvre

PPP – Contrats de délégation de services .

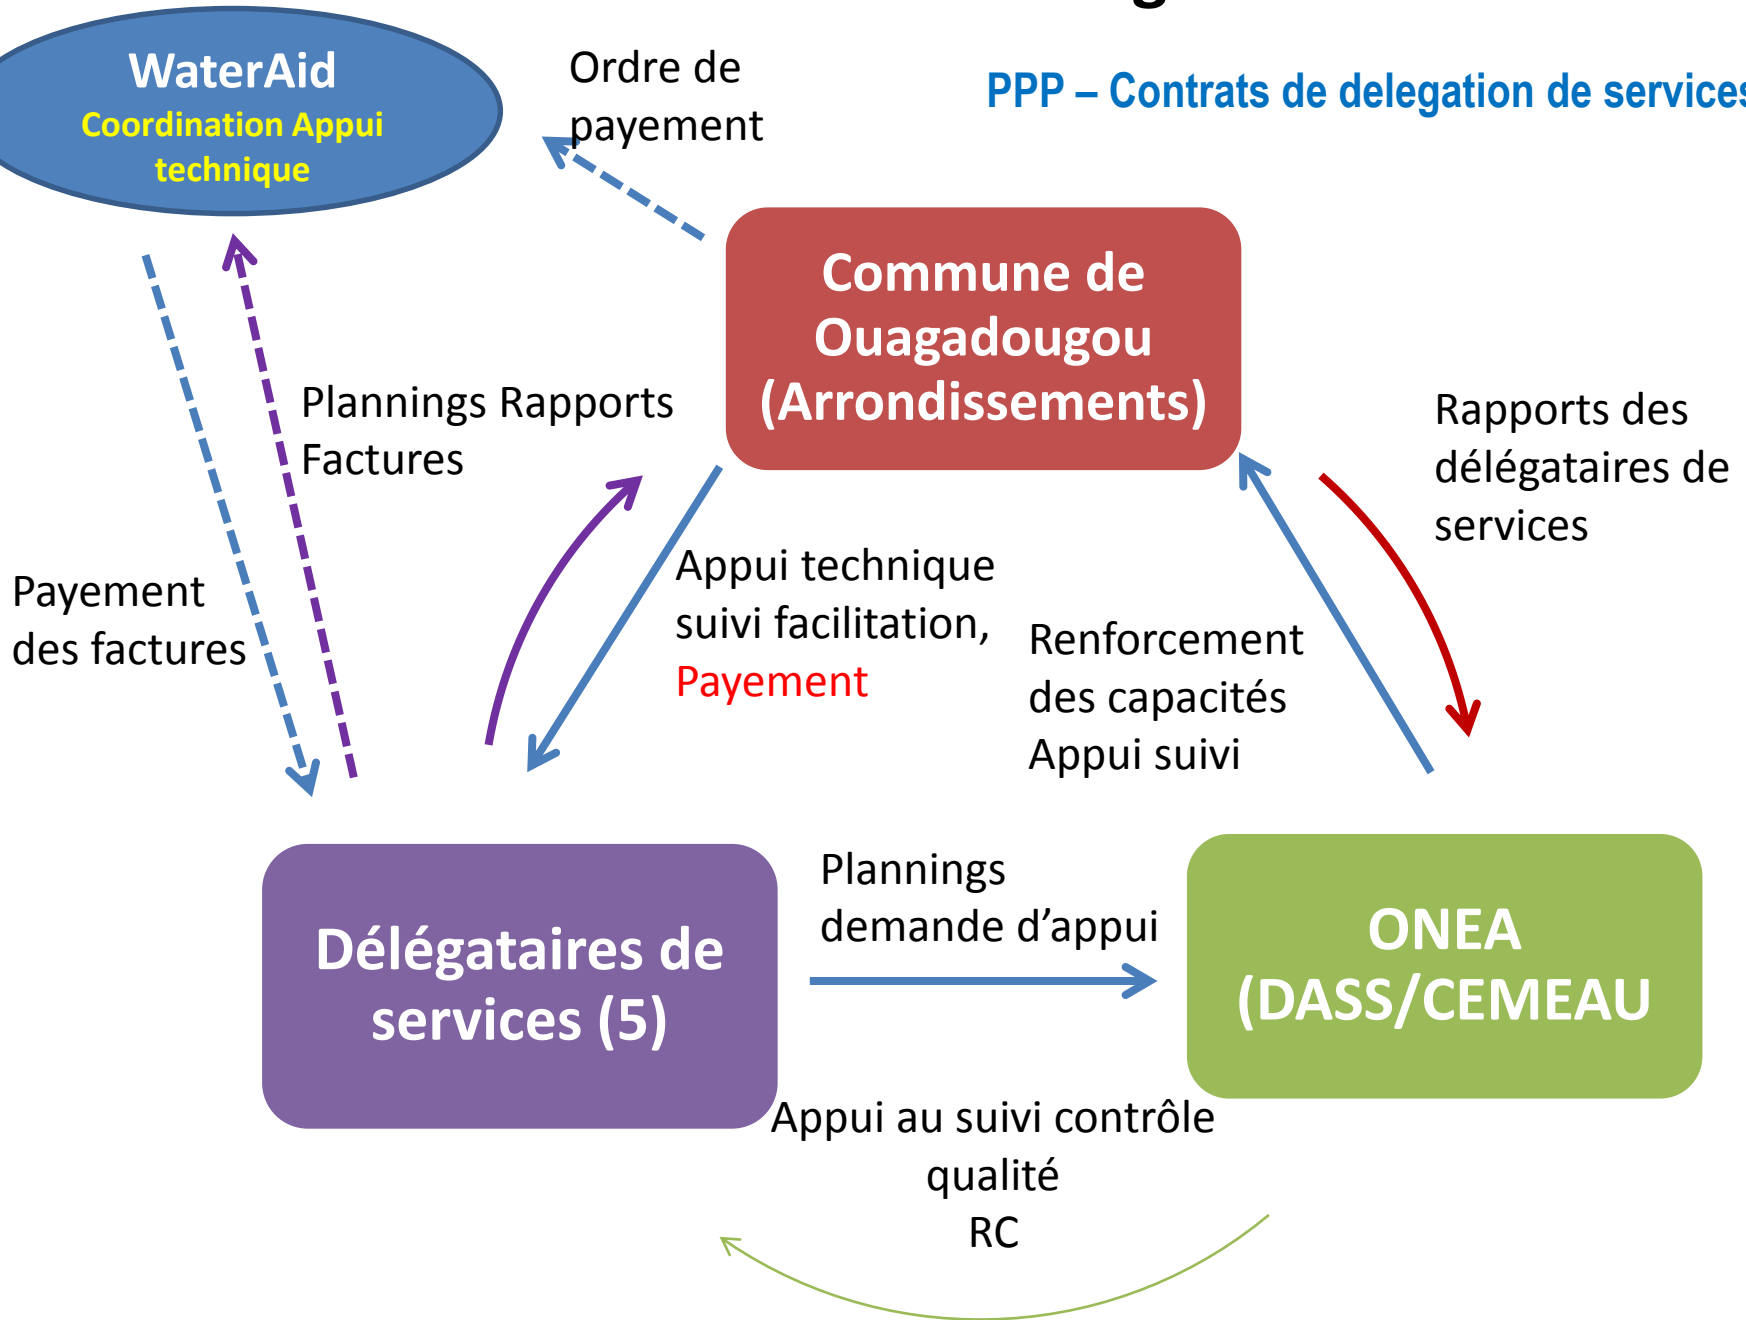

# 5. Résultats

- Mise en place et fonctionnement (équipement) des 7 STCA / CDI
- Une situation de référence AEPHA (2014) dans les QNLP de Ouagadougou (INSD, PEA GIZ )
- Nouvelle technologie de latrine adaptée au quartiers non lotis (latrine amovible Lilli)
- Professionnalisation des nouveaux acteurs dans le secteur de l'assainissement urbain périurbain : DSP Assainissement



# 5. Résultats

- Introduction du E-monitoring SMARTPHONE et mWater dans le suivi des réalisations
- **15 913/15 880** ouvrages réalisés/réhabilités dont **160** pour ménages vulnérables **entièrement subventionnés puis adaptés**
- **13 612/15 913** ouvrages déployés mWater (**85,54%**) au 30/06/17
- **74/85** blocs de latrines communautaires sont réalisées.



# Réalisations par Arrondissement

Arrondissement	Réalisation	Réhabilitation	Douche-Puisard	TOTAL
3	555	1 251	4	1 810
4	770	1 017	26	1 813
7	395	1 347	10	1 752
8	378	2 237	8	2 623
9	373	1 217	3	1 593
10	612	5 203	34	5 849
11	84	219	5	308
12	51	112	2	165
<b>TOTAL</b>	<b>3 218</b>	<b>12 603</b>	<b>92</b>	<b>15 913</b>







# 5. Difficultés

## Contraintes socio-politiques :

- 2013 – 2017: les périodes post électorales et préélectorales : meetings, manifestations socio politiques etc.
- L'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014 suivie de la mise en place d'un gouvernement de transition et des délégations spéciales.

## Contraintes techniques :

- Promotion de l'hygiène et l'assainissement: nouvelles approches à intégrer par les Délégués
- Difficultés d'intégrer les activités d'Assainissement d aux contrats DSP eau potable
- Stratégie de transfert des fonds et flux financier



# 6. Leçons apprises

- Mise en œuvre de l'ATPC dans les quartiers non lotis.
- Organisation d'une course cycliste pour la sensibilisation.
- Organisation du concours de créativité: latrine adaptée au contexte de zone non lotie.
- DSP assainissement au privé et renforcement des capacités communales contribue à un meilleur suivi de l'accès aux services publics







# Merci !

